



DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

ve službách bezpečnosti silničního provozu

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

UZAVŘENÍ VIADUKTU U DYNÍNA

Vypracoval: Karel Pekař

Datum: březen 2019

1. ÚVOD K DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉMU OPATŘENÍ

Dopravně inženýrské opatření (dále DIO) „Uzavření viaduktu u Dynína“ bylo zpracováno na základě objednávky firmy COLAS a.s.

2. POPIS DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉHO OPATŘENÍ

Lokalita: III/1555 - viadukt u Dynína

Termín: 27.4.2019 od 12:00 - 28.4.2019 do 12:00 a 1.6.2019 od 10:00 do 2.6.2019 do 12:00

Popis omezení:

Úplná uzavírka silnice III/1555.

Stávající dopravní značení: budou zneplatněny všechny DZ, které by byly v rozporu s přechodnou úpravou

3. GRAFICKÁ ČÁST

dopravního značení je na konci grafické části. Symbol značky je nasměrován podélně ve směru jízdy a to Značky jsou zakresleny symbolem tvaru dopravní značky, skutečným označením (dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., Ministerstva dopravy), např. A 12, P 2 a evidenčními čísly. Detailní rozkreslení

i v případě, že z nedostatku místa není nakreslen přímo na místě instalace. Vztah k místu instalace je v tomto případě vyjádřen odkazovou šipkou.

4. ZÁVĚR

Dopravně inženýrské opatření bylo zpracováno tak, aby dopravní značení bylo v souladu s aktuálně platnými zákony, normami a technickými podmínkami s přihlédnutím k místní dopravní situaci pro zajištění větší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Detail 2

- uzavřený úsek
-  **B 20a** - navržené přechodné dopravní značení
-  **B 13** - stávající dopravní značení
- vedení objízdné trasy pro veškerý provoz ve směru k silnici II/603
- vedení objízdné trasy pro vozidla nad 3,5t ve směru od silnice II/603

E 13 (1)

IP 22

MIMO
VOZIDEL
STAVBY

POZOR



SILNICE III/1555
POD ŽELEZNIČNÍ
TRATÍ
UZAVŘENA

Dynín

Bošilecký p

Bošilecký
ryb.


Bošilecký ryb.

BUDĚJOVICE

U Hájku
▲
438

A horizontal scale bar with markings at 200, 400, and 600 meters.

Detail 1

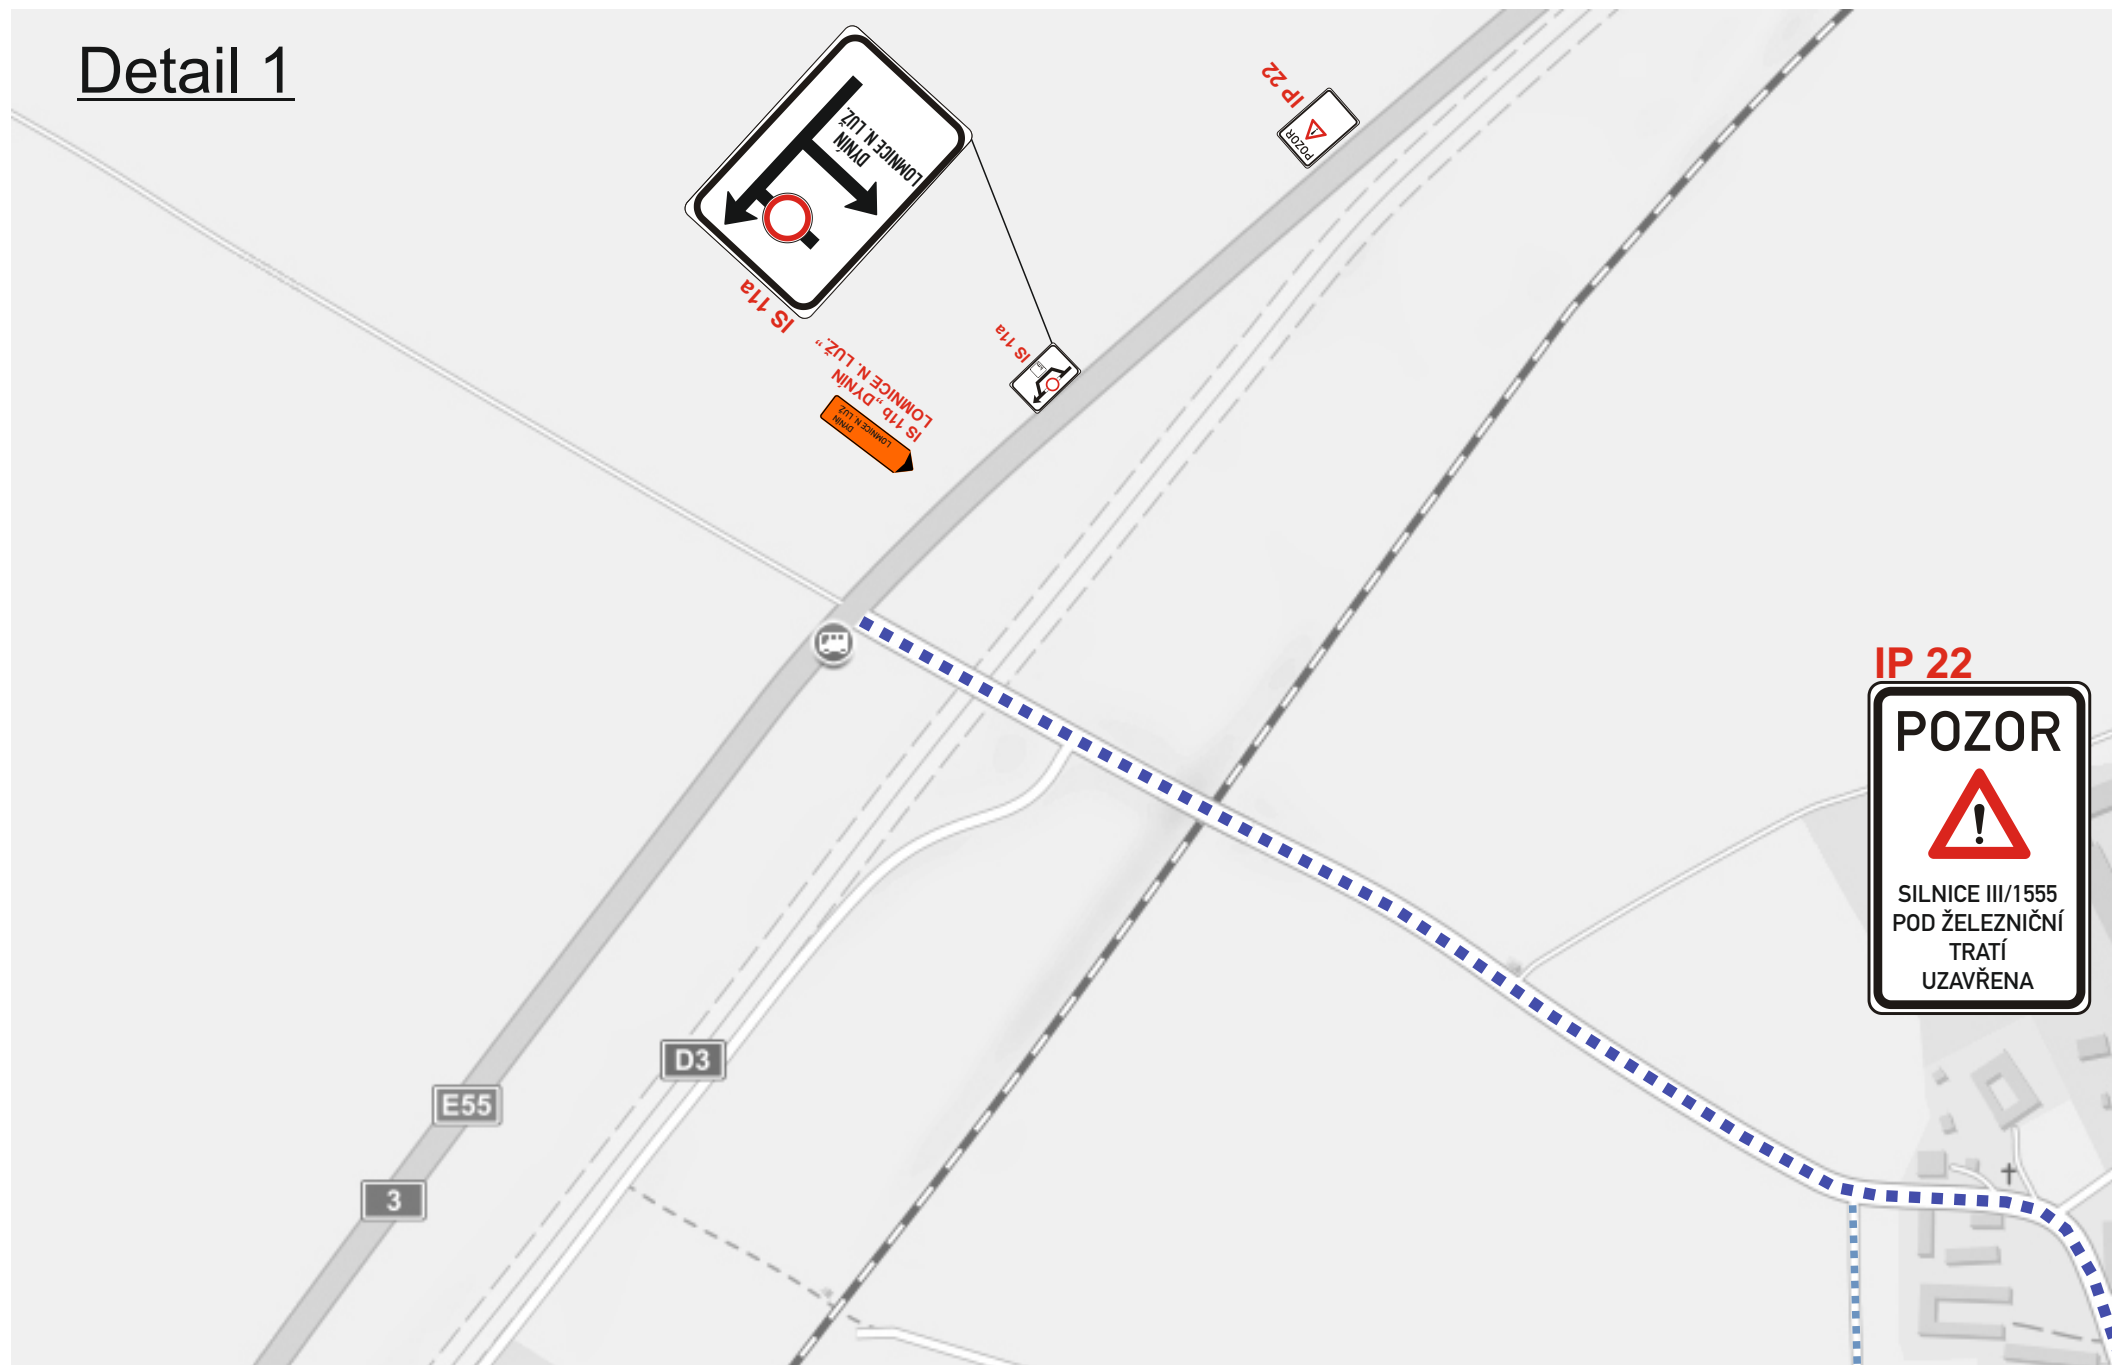

Detail 2

